

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Выполнение работ по укладке сценического покрытия для сцены в СП «ДК «Металлург» МБУ  
«ДК им. 1 Мая» по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский,  
ул. Горького, д. 5»

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 500 000	999 000	486 000	15 000	1 500 000	999 000	486 000	15 000	1 500 000	999 000	486 000	15 000	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 06.10.2025 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 13.10.2025 г.

5. К отчету прилагаются на фотографии объекта по итогам реализации проекта – до начала работ, после окончания работ – на 8 листах.

Инициатор (представитель инициативной группы), депутат Московской областной Думы:

Максимович Павел Иванович

(Ф.И.О.)

  
(подпись)


Глава городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата «28» 11 2025 г.


  
(подпись)





СТАЛО



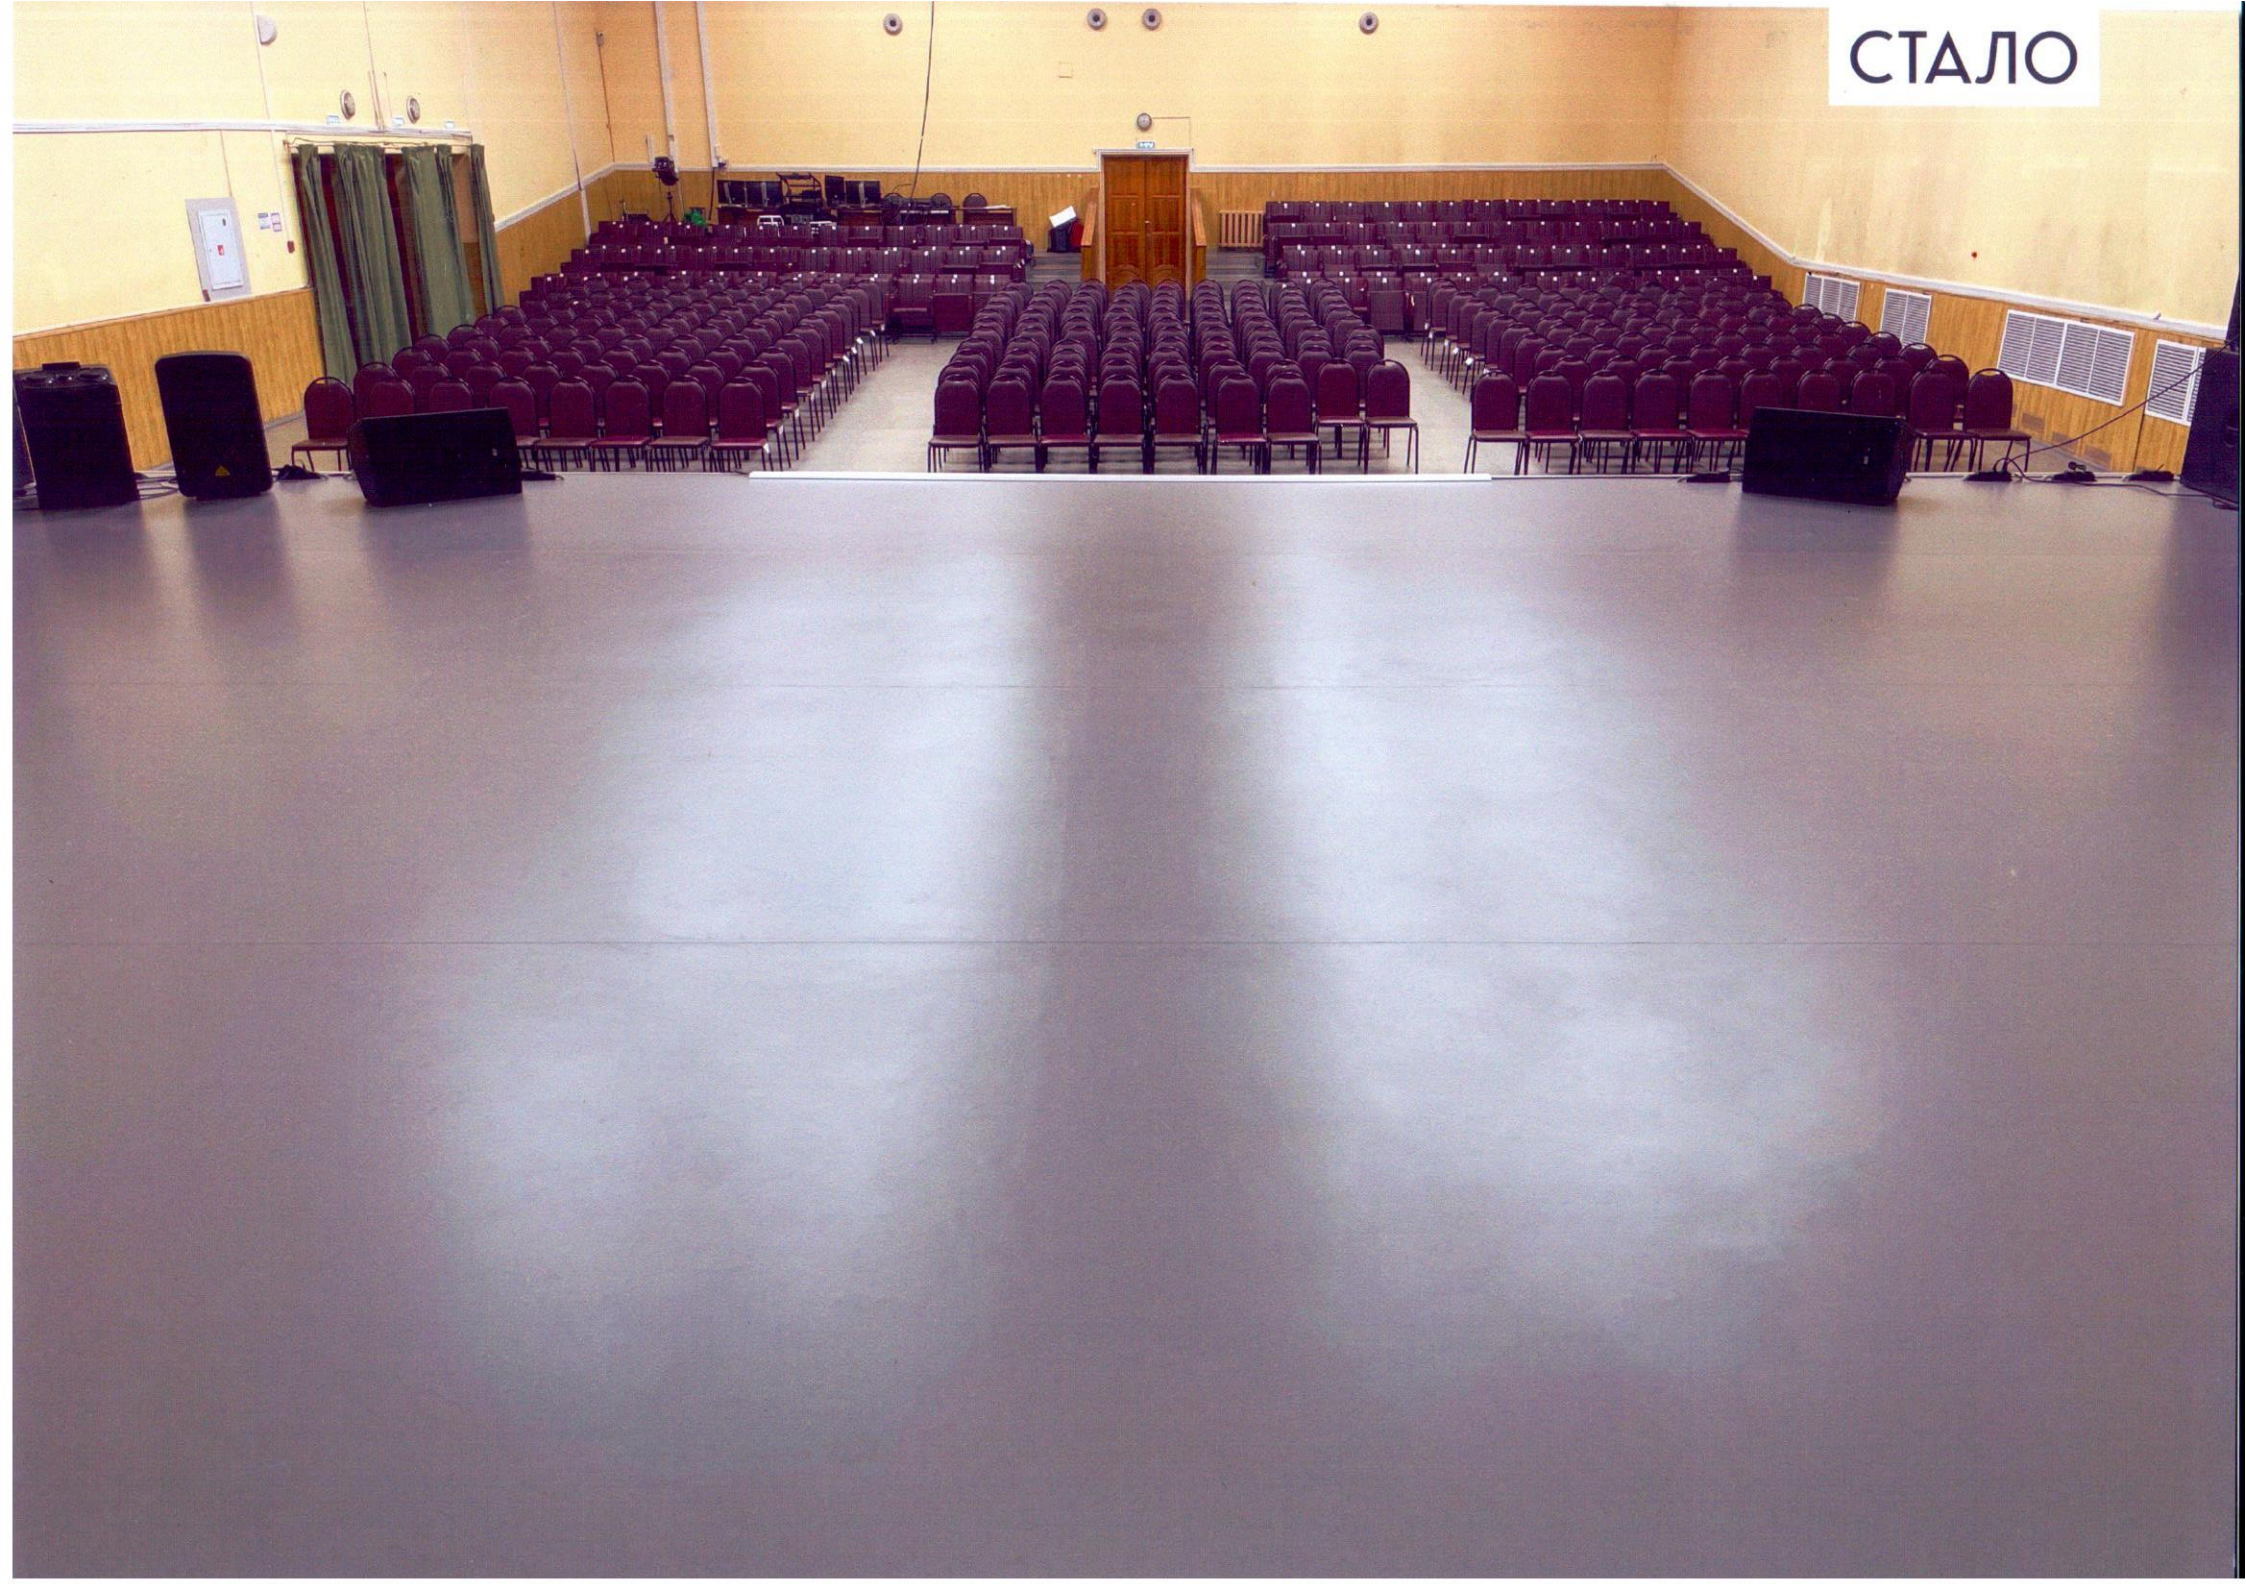

СТАЛО





СТАЛО

